

攀枝花市众立诚实业有限公司


整改回复报告

攀枝花市生态环境局：

为积极配合四川省“三磷”排查整治“回头看”工作，公司高度重视，立即开展企业自查，经过自查行动，公司主要存在以下三项问题：1、磷渣贮存区域未采取苫盖措施防治扬尘，喷淋装置损坏；2、原料储存场所未采取苫盖措施防治扬尘，喷淋装置损坏；3、原料输送封闭通道部分密闭罩损坏。根据贵局“一企一策”整治要求，公司于“三磷”排查工作后立即对以上三点问题进行整改，并于2023年3月前完成整改，现将整改报告提至交贵局，以下为整改内容：

1、对磷渣贮存区磷渣表面采用密目防尘网进行覆盖，更换损坏的喷淋管线；

整改情况：公司于2022年12月已完成对磷渣贮存区磷渣表明覆盖和损坏喷淋管线的更换。

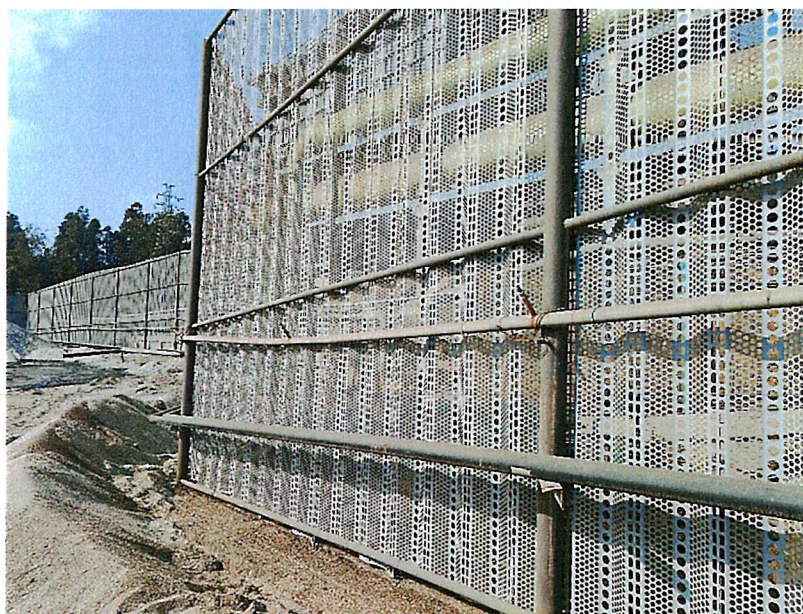

2、对原料储存场原料表面采用密目防尘网进行覆盖，更换损坏

的喷淋管线；

整改情况：公司于 2022 年 12 月完成对原料储存场原料表面覆盖和喷淋管线更换。



3、更换原料输送设施破损的密闭罩；

整改情况：公司于 2023 年 2 月完成原料输送设施密闭罩的更换。



整改工作内容情况一览表

序号	隐患内容	整改内容	整改工作统计	是否满足要求	投资情况 (万元)	后期运行 维护要求
1	磷渣贮存区域未采取苫盖措施防治扬尘，喷淋装置损坏	磷渣贮存区域表面用密目防尘网进行覆盖，更换损坏的喷淋管线	已采用密目网对磷渣堆存表面（不扰动的部分）进行遮盖，遮盖面积约2300m ² ，检查和更换雾化喷嘴11个	满足“三磷”整改要求、《攀枝花市大气污染防治办法》及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》	1.2	1、每天加强密目网遮盖情况的检查，并及时更换破损处。
2	原料储存场所未采取苫盖措施防治扬尘，喷淋装置损坏	对原料储存场表面用密目防尘网进行覆盖，更换损坏的喷淋管线。	已采用密目网对原料储存场表面（不扰动的部分）进行遮盖，遮盖面积约3300m ² ，检查和更换雾化喷嘴7个	满足“三磷”整改要求及《攀枝花市大气污染防治办法》	1.5	2、每天检查雾化喷嘴的运行情况，定期更换损坏喷嘴。通过以上措施减少无组织颗粒物的排放。
3	原料输送封闭通道部分密闭罩损坏	更换原料输送设施破损的密闭罩。	已更换原料输送通廊损毁的密闭罩4处（共约28m ² ）		0.4	

攀枝花市立诚实业有限公司

2013年12月24日



会议签到表

会议名称	"三磷"定项排查整治"回头看"整改工作验收会议.		
会议日期	2023年12月23日.	地点	众益磷业有限公司会议室.
主持人	代保. 夏荣恒.		
主题	"三磷"整改工作专家验收.		
参会人员签名			
序号	姓名	部门/职务	
1	洪德兵	四川省攀枝花市环境检测中心站	
2	代保	攀枝花市生态环境局	
3	夏荣恒	攀枝花市众益磷业有限公司.	
4	黄荣浩	攀枝花市众益磷业有限公司.	
5	龚伟	攀枝花市众益磷业有限公司	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			



攀枝花市众立诚实业有限公司“三磷”排查整治“回头看” 整改工作验收意见

2023年12月23日，攀枝花市众立诚实业有限公司邀请了部分环保专家，成立了专家组，组织召开了攀枝花市众立诚实业有限公司“三磷”排查整治“回头看”整改工作验收会议。专家组听取了项目情况介绍，经查阅资料、现场核查，形成如下验收意见。

一、该企业按照《长江“三磷”专项排查整治技术指南》《四川省“三磷”专项排查整治行动工作方案》等有关文件要求，对3个自查问题进行了整改，按期如实完成了一企一策主要整治内容，基本实现了整改目标。依据《四川省“三磷”专项排查整治核查验收规程（试行）》，专家组同意通过验收。

二、意见建议。

- 1.完善自主验收材料，完善验收报告的有关数据，补充有关附图、附件。
- 2.加强环保设施巡检和维护。

专家组：

洪德忠 代俊

2023年12月23日

专家意见修改说明表

1	完善自主验收材料,完善验收报告的有关数据,补充有关附图、附件	已完善自主验收材料,已补充验收报告的有关数据,已补充完善整改后的照片
2	加强环保设施巡检和维护	已制定制度加强环保设施巡检和维护

